


Planning Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City

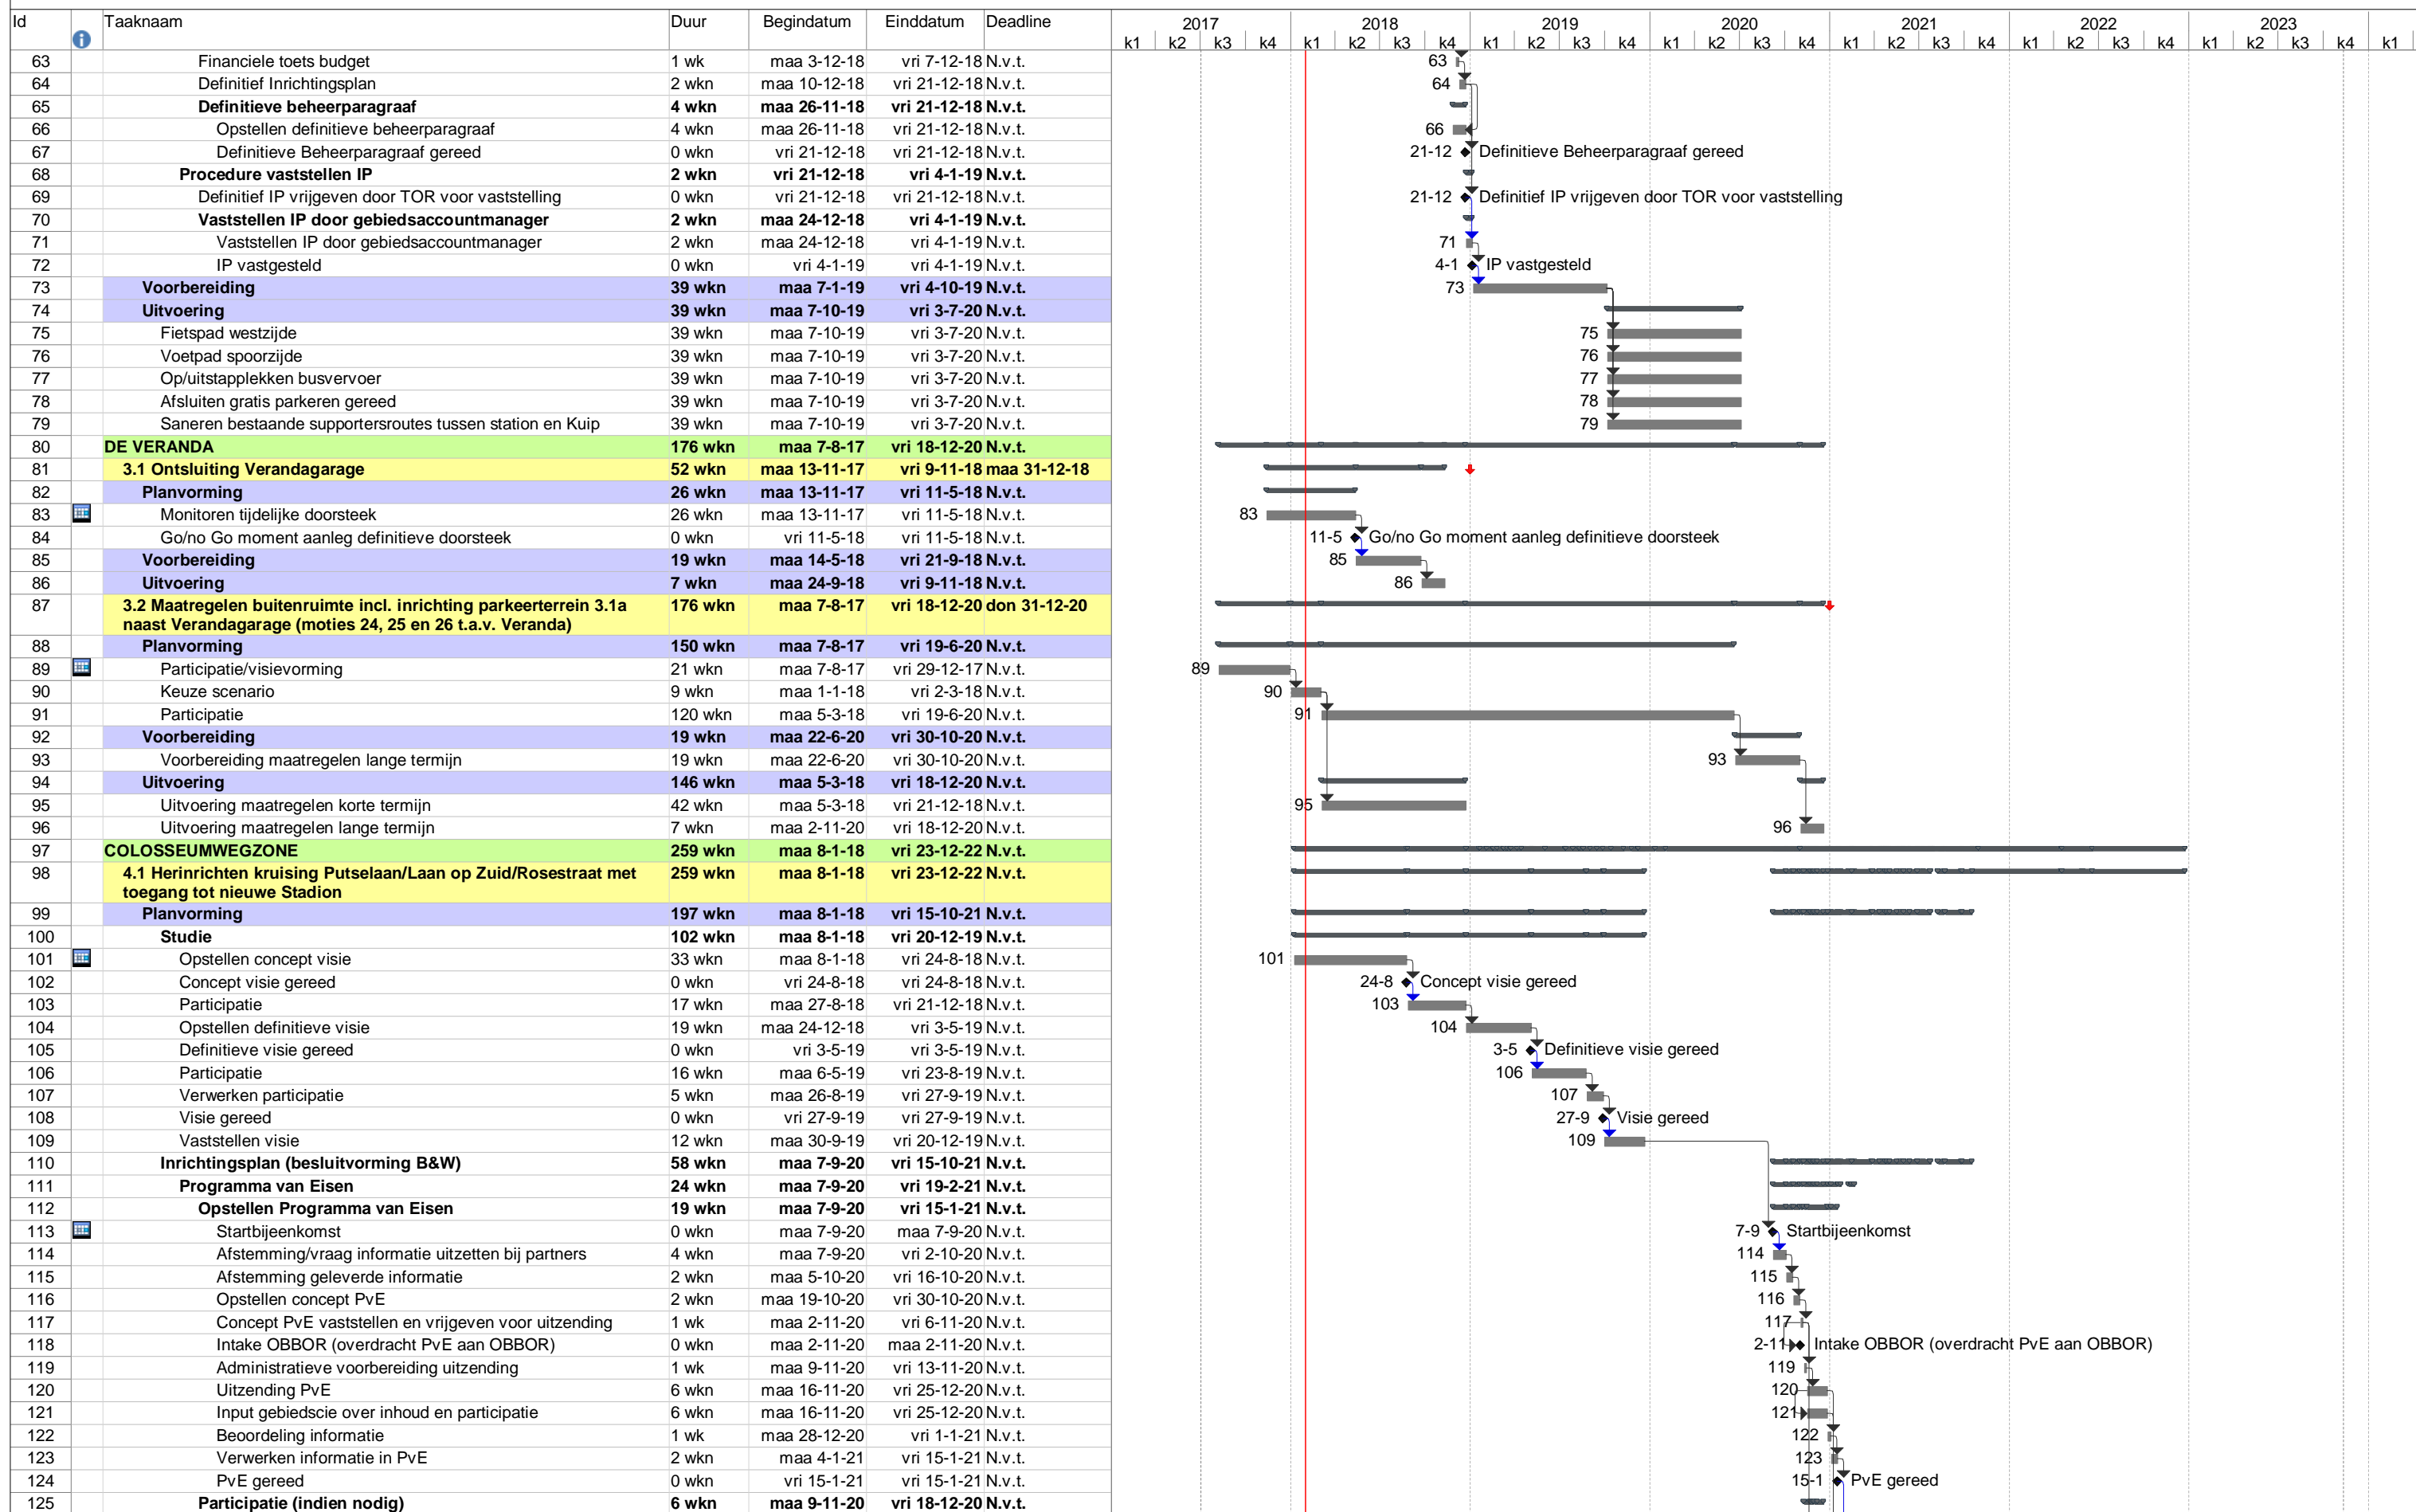

Planning Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City


Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Deadline	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023							
						k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4				
252	Programma van Eisen	24 wkn	vri 21-12-18	vri 7-6-19 N.v.t.																																	
253	Opstellen Programma van Eisen	19 wkn	vri 21-12-18	vri 3-5-19 N.v.t.																																	
254	Startbijeenkomst	0 wkn	vri 21-12-18	vri 21-12-18 N.v.t.																																	
255	Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners	4 wkn	maa 24-12-18	vri 18-1-19 N.v.t.																																	
256	Afstemming geleverde informatie	2 wkn	maa 21-1-19	vri 1-2-19 N.v.t.																																	
257	Opstellen concept PvE	2 wkn	maa 4-2-19	vri 15-2-19 N.v.t.																																	
258	Concept PvE vaststellen en vrijgeven voor uitzending	1 wk	maa 18-2-19	vri 22-2-19 N.v.t.																																	
259	Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR)	0 wkn	maa 18-2-19	maa 18-2-19 N.v.t.																																	
260	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 25-2-19	vri 1-3-19 N.v.t.																																	
261	Uitzending PvE	6 wkn	maa 4-3-19	vri 12-4-19 N.v.t.																																	
262	Input gebiedscie over inhoud en participatie	6 wkn	maa 4-3-19	vri 12-4-19 N.v.t.																																	
263	Beoordeling informatie	1 wk	maa 15-4-19	vri 19-4-19 N.v.t.																																	
264	Verwerken informatie in PvE	2 wkn	maa 22-4-19	vri 3-5-19 N.v.t.																																	
265	PvE gereed	0 wkn	vri 3-5-19	vri 3-5-19 N.v.t.																																	
266	Participatie (indien nodig)	6 wkn	maa 25-2-19	vri 5-4-19 N.v.t.																																	
267	Voorbereiden participatie	2 wkn	maa 25-2-19	vri 8-3-19 N.v.t.																																	
268	Participatie	1 wk	maa 11-3-19	vri 15-3-19 N.v.t.																																	
269	Beoordeling informatie bewonersavond	1 wk	maa 18-3-19	vri 22-3-19 N.v.t.																																	
270	Verslag participatie	2 wkn	maa 25-3-19	vri 5-4-19 N.v.t.																																	
271	Toetsen en vastellen PvE	5 wkn	maa 6-5-19	vri 7-6-19 N.v.t.																																	
272	Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie gebou	1 wk	maa 6-5-19	vri 10-5-19 N.v.t.																																	
273	Toetsen PvE door TOR	0 wkn	vri 24-5-19	vri 24-5-19 N.v.t.																																	
274	Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager	1 wk	maa 27-5-19	vri 31-5-19 N.v.t.																																	
275	Verzenden advies aan wethouder	1 wk	maa 3-6-19	vri 7-6-19 N.v.t.																																	
276	Voorlopig IP	24 wkn	maa 15-4-19	vri 27-9-19 N.v.t.																																	
277	Maken Voorlopig IP	13 wkn	maa 15-4-19	vri 12-7-19 N.v.t.																																	
278	Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending	0 wkn	vri 26-7-19	vri 26-7-19 N.v.t.																																	
279	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 29-7-19	vri 2-8-19 N.v.t.																																	
280	Vooruitzending	6 wkn	maa 5-8-19	vri 13-9-19 N.v.t.																																	
281	Voorlopige beheerparagraaf	10 wkn	maa 3-6-19	vri 9-8-19 N.v.t.																																	
282	Opstellen voorlopige beheerparagraaf	6 wkn	maa 3-6-19	vri 12-7-19 N.v.t.																																	
283	Behandeling voorlopige beheerparagraaf	4 wkn	maa 15-7-19	vri 9-8-19 N.v.t.																																	
284	Overleg nutsbedrijven	0 wkn	vri 26-7-19	vri 26-7-19 N.v.t.																																	
285	Start overleg kabels en leidingen	0 wkn	vri 26-7-19	vri 26-7-19 N.v.t.																																	
286	Participatie	6 wkn	maa 29-7-19	vri 6-9-19 N.v.t.																																	
287	Voorbereiden participatie	2 wkn	maa 29-7-19	vri 9-8-19 N.v.t.																																	
288	Participatie	1 wk	maa 12-8-19	vri 16-8-19 N.v.t.																																	
289	Verslag participatie	3 wkn	maa 19-8-19	vri 6-9-19 N.v.t.																																	
290	Advies gebiedscommissie	4 wkn	maa 2-9-19	vri 27-9-19 N.v.t.																																	
291	Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weke	4 wkn	maa 2-9-19	vri 27-9-19 N.v.t.																																	
292	Definitief IP	8 wkn	maa 16-9-19	vri 8-11-19 N.v.t.																																	
293	Opstellen Definitief IP	6 wkn	maa 16-9-19	vri 25-10-19 N.v.t.																																	
294	Opstellen reactiedocument	2 wkn	maa 16-9-19	vri 27-9-19 N.v.t.																																	
295	Opstellen Ramingen	4 wkn	maa 14-10-19	vri 8-11-19 N.v.t.																																	
296	Definitief Inrichtingsplan	0 wkn	vri 8-11-19	vri 8-11-19 N.v.t.																																	
297	Definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 14-10-19	vri 8-11-19 N.v.t.																																	
298	Opstellen definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 14-10-19	vri 8-11-19 N.v.t.																																	
299	Definitieve Beheerparagraaf gereed	0 wkn	vri 8-11-19	vri 8-11-19 N.v.t.																																	
300	Procedure vaststellen IP	10 wkn	vri 22-11-19	vri 31-1-20 N.v.t.																																	
301	Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling	0 wkn	vri 22-11-19	vri 22-11-19 N.v.t.																																	
302	Vaststellen IP door B&W	10 wkn	maa 25-11-19	vri 31-1-20 N.v.t.																																	
303	Opstellen agendapost	2 wkn	maa 25-11-19	vri 6-12-19 N.v.t.																																	

Planning Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Deadline	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023											
						k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1							
379	Steiger 2	7 wkn	maa 9-11-20	vri 25-12-20	don 31-12-20																																				
380	Steiger 3	7 wkn	maa 31-10-22	vri 16-12-22	zat 31-12-22																																				
381	6.2 Aanlegsteiger Kralingen/De Esch	120 wkn	maa 4-9-17	vri 20-12-19	din 31-12-19																																				
382	Planvorming	87 wkn	maa 4-9-17	vri 3-5-19	N.v.t.																																				
383	Inrichtingsplan (besluitvorming B&W)	59 wkn	maa 4-9-17	vri 19-10-18	N.v.t.																																				
384	Programma van Eisen	24 wkn	maa 16-4-18	vri 28-9-18	N.v.t.																																				
385	Opstellen Programma van Eisen	19 wkn	maa 16-4-18	vri 24-8-18	N.v.t.																																				
386	Startbijeenkomst	0 wkn	maa 16-4-18	maa 16-4-18	N.v.t.					16-4																															
387	Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners	4 wkn	maa 16-4-18	vri 11-5-18	N.v.t.																																				
388	Afstemming geleverde informatie	2 wkn	maa 14-5-18	vri 25-5-18	N.v.t.																																				
389	Opstellen concept PvE	2 wkn	maa 28-5-18	vri 8-6-18	N.v.t.																																				
390	Concept PvE vaststellen en vrijgeven voor uitzending	1 wk	maa 11-6-18	vri 15-6-18	N.v.t.																																				
391	Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR)	0 wkn	maa 11-6-18	maa 11-6-18	N.v.t.																																				
392	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 18-6-18	vri 22-6-18	N.v.t.																																				
393	Uitzending PvE	6 wkn	maa 25-6-18	vri 3-8-18	N.v.t.																																				
394	Input gebiedsctie over inhoud en participatie	6 wkn	maa 25-6-18	vri 3-8-18	N.v.t.																																				
395	Beoordeling informatie	1 wk	maa 6-8-18	vri 10-8-18	N.v.t.																																				
396	Verwerken informatie in PvE	2 wkn	maa 13-8-18	vri 24-8-18	N.v.t.																																				
397	PvE gereed	0 wkn	vri 24-8-18	vri 24-8-18	N.v.t.																																				
398	Participatie (indien nodig)	6 wkn	maa 18-6-18	vri 27-7-18	N.v.t.																																				
399	Vorbereiden participatie	2 wkn	maa 18-6-18	vri 29-6-18	N.v.t.																																				
400	Participatie	1 wk	maa 2-7-18	vri 6-7-18	N.v.t.																																				
401	Beoordeling informatie bewonersavond	1 wk	maa 9-7-18	vri 13-7-18	N.v.t.																																				
402	Verslag participatie	2 wkn	maa 16-7-18	vri 27-7-18	N.v.t.																																				
403	Toetsen en vaststellen PvE	5 wkn	maa 27-8-18	vri 28-9-18	N.v.t.																																				
404	Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie gebou	1 wk	maa 27-8-18	vri 31-8-18	N.v.t.																																				
405	Toetsen PvE door TOR	0 wkn	vri 14-9-18	vri 14-9-18	N.v.t.																																				
406	Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager	1 wk	maa 17-9-18	vri 21-9-18	N.v.t.																																				
407	Verzenden advies aan wethouder	1 wk	maa 24-9-18	vri 28-9-18	N.v.t.																																				
408	Voorlopig IP	21 wkn	maa 6-8-18	vri 28-12-18	N.v.t.																																				
409	Maken Voorlopig IP	10 wkn	maa 6-8-18	vri 12-10-18	N.v.t.																																				
410	Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending	0 wkn	vri 26-10-18	vri 26-10-18	N.v.t.																																				
411	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 29-10-18	vri 2-11-18	N.v.t.																																				
412	Vooruitzending	6 wkn	maa 5-11-18	vri 14-12-18	N.v.t.																																				
413	Voorlopige beheerparagraaf	10 wkn	maa 3-9-18	vri 9-11-18	N.v.t.																																				
414	Opstellen voorlopige beheerparagraaf	6 wkn	maa 3-9-18	vri 12-10-18	N.v.t.																																				
415	Behandeling voorlopige beheerparagraaf	4 wkn	maa 15-10-18	vri 9-11-18	N.v.t.																																				
416	Overleg nutsbedrijven	0 wkn	vri 26-10-18	vri 26-10-18	N.v.t.																																				
417	Start overleg kabels en leidingen	0 wkn	vri 26-10-18	vri 26-10-18	N.v.t.																																				
418	Participatie	6 wkn	maa 29-10-18	vri 7-12-18	N.v.t.																																				
419	Vorbereiden participatie	2 wkn	maa 29-10-18	vri 9-11-18	N.v.t.																																				
420	Participatie	1 wk	maa 12-11-18	vri 16-11-18	N.v.t.																																				
421	Verslag participatie	3 wkn	maa 19-11-18	vri 7-12-18	N.v.t.																																				
422	Advies gebiedscommissie	4 wkn	maa 3-12-18	vri 28-12-18	N.v.t.																																				
423	Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weke	4 wkn	maa 3-12-18	vri 28-12-18	N.v.t.																																				
424	Definitief IP	8 wkn	maa 17-12-18	vri 8-2-19	N.v.t.																																				
425	Opstellen Definitief IP	6 wkn	maa 17-12-18	vri 25-1-19	N.v.t.																																				
426	Opstellen reactiedocument	2 wkn	maa 17-12-18	vri 28-12-18	N.v.t.																																				
427	Opstellen Ramingen	4 wkn	maa 14-1-19	vri 8-2-19	N.v.t.																																				
428	Definitief Inrichtingsplan	0 wkn	vri 8-2-19	vri 8-2-19	N.v.t.																																				
429	Definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 14-1-19	vri 8-2-19	N.v.t.																																				

Planning Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Deadline	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
						k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
442	6.4 Aanlegsteiger Stormpolder in Krimpen aan den IJssel incl. afspraken parkeercapaciteit	0,2 wkn?	maa 4-9-17	maa 4-9-17	zat 31-12-22																												
443	PROJECTEN ELDERSEN IN DE STAD	323 wkn?	maa 4-9-17	vri 10-11-23	N.v.t.																												
444	7.1 Keerlus tram Wilhelminaplein inclusief herinrichting omgeving	136 wkn	maa 2-4-18	vri 6-11-20	don 31-12-20																												
445	Planvorming	58 wkn	maa 2-4-18	vri 10-5-19	N.v.t.																												
446	Inrichtingsplan (besluitvorming B&W)	58 wkn	maa 2-4-18	vri 10-5-19	N.v.t.																												
447	Programma van Eisen	24 wkn	maa 2-4-18	vri 14-9-18	N.v.t.																												
448	Opstellen Programma van Eisen	19 wkn	maa 2-4-18	vri 10-8-18	N.v.t.																												
449	Startbijeenkomst	0 wkn	maa 2-4-18	maa 2-4-18	N.v.t.																												
450	Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners	4 wkn	maa 2-4-18	vri 27-4-18	N.v.t.																												
451	Afstemming geleverde informatie	2 wkn	maa 30-4-18	vri 11-5-18	N.v.t.																												
452	Opstellen concept PvE	2 wkn	maa 14-5-18	vri 25-5-18	N.v.t.																												
453	Concept PvE vaststellen en vrijgeven voor uitzending	1 wk	maa 28-5-18	vri 1-6-18	N.v.t.																												
454	Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR)	0 wkn	maa 28-5-18	maa 28-5-18	N.v.t.																												
455	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 4-6-18	vri 8-6-18	N.v.t.																												
456	Uitzending PvE	6 wkn	maa 11-6-18	vri 20-7-18	N.v.t.																												
457	Input gebiedscie over inhoud en participatie	6 wkn	maa 11-6-18	vri 20-7-18	N.v.t.																												
458	Beoordeling informatie	1 wk	maa 23-7-18	vri 27-7-18	N.v.t.																												
459	Verwerken informatie in PvE	2 wkn	maa 30-7-18	vri 10-8-18	N.v.t.																												
460	PvE gereed	0 wkn	vri 10-8-18	vri 10-8-18	N.v.t.																												
461	Participatie (indien nodig)	6 wkn	maa 4-6-18	vri 13-7-18	N.v.t.																												
462	Voorbereiden participatie	2 wkn	maa 4-6-18	vri 15-6-18	N.v.t.																												
463	Participatie	1 wk	maa 18-6-18	vri 22-6-18	N.v.t.																												
464	Beoordeling informatie bewonersavond	1 wk	maa 25-6-18	vri 29-6-18	N.v.t.																												
465	Verslag participatie	2 wkn	maa 2-7-18	vri 13-7-18	N.v.t.																												
466	Toetsen en vaststellen PvE	5 wkn	maa 13-8-18	vri 14-9-18	N.v.t.																												
467	Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie gebou	1 wk	maa 13-8-18	vri 17-8-18	N.v.t.																												
468	Toetsen PvE door TOR	0 wkn	vri 31-8-18	vri 31-8-18	N.v.t.																												
469	Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager	1 wk	maa 3-9-18	vri 7-9-18	N.v.t.																												
470	Verzenden advies aan wethouder	1 wk	maa 10-9-18	vri 14-9-18	N.v.t.																												
471	Voorlopig IP	24 wkn	maa 23-7-18	vri 4-1-19	N.v.t.																												
472	Maken Voorlopig IP	13 wkn	maa 23-7-18	vri 19-10-18	N.v.t.																												
473	Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending	0 wkn	vri 2-11-18	vri 2-11-18	N.v.t.																												
474	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 5-11-18	vri 9-11-18	N.v.t.																												
475	Vooruitzending	6 wkn	maa 12-11-18	vri 21-12-18	N.v.t.																												
476	Voorlopige beheerparagraaf	10 wkn	maa 10-9-18	vri 16-11-18	N.v.t.																												
477	Opstellen voorlopige beheerparagraaf	6 wkn	maa 10-9-18	vri 19-10-18	N.v.t.																												
478	Behandeling voorlopige beheerparagraaf	4 wkn	maa 22-10-18	vri 16-11-18	N.v.t.																												
479	Overleg nutsbedrijven	0 wkn	vri 2-11-18	vri 2-11-18	N.v.t.																												
480	Start overleg kabels en leidingen	0 wkn	vri 2-11-18	vri 2-11-18	N.v.t.																												
481	Participatie	6 wkn	maa 5-11-18	vri 14-12-18	N.v.t.																												
482	Voorbereiden participatie	2 wkn	maa 5-11-18	vri 16-11-18	N.v.t.																												
483	Participatie	1 wk	maa 19-11-18	vri 23-11-18	N.v.t.																												
484	Verslag participatie	3 wkn	maa 26-11-18	vri 14-12-18	N.v.t.																												
485	Advies gebiedscommissie	4 wkn	maa 10-12-18	vri 4-1-19	N.v.t.																												
486	Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weke	4 wkn	maa 10-12-18	vri 4-1-19	N.v.t.																												
487	Definitief IP	8 wkn	maa 24-12-18	vri 15-2-19	N.v.t.																												
488	Opstellen Definitief IP	6 wkn	maa 24-12-18	vri 1-2-19	N.v.t.																												
489	Opstellen reactiedocument	2 wkn	maa 24-12-18	vri 4-1-19	N.v.t.																												
490	Opstellen Ramingen	4 wkn	maa 21-1-19	vri 15-2-19	N.v.t.																												
491	Definitief Inrichtingsplan	0 wkn	vri 15-2-19	vri 15-2-19	N.v.t.																												
492	Definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 21-1-19	vri 15-2-19	N.v.t.																												
493	Opstellen definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 21-1-19	vri 15-2-19	N.v.t.																												
494	Definitieve Beheerparagraaf gereed	0 wkn	vri 15-2-19	vri 15-2-19	N.v.t.																												
495	Procedure vaststellen IP	10 wkn	vri 1-3-19	vri 10-5-19	N.v.t.																												
496	Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling	0 wkn	vri 1-3-19	vri 1-3-19	N.v.t.																												
497	Vaststellen IP door B&W	10 wkn	maa 4-3-19	vri 10-5-19	N.v.t.																												
498	Opstellen agendapost	2 wkn	maa 4-3-19	vri 15-3-19	N.v.t.																												
499	Interne parafering	5 wkn	maa 18-3-19	vri 19-4-19	N.v.t.																												
500	Vaststellen agendapost door B&W	3 wkn	maa 22-4-19	vri 10-5-19	N.v.t.																												
501	IP vastgesteld	0 wkn	vri 10-5-19	vri 10-5-19	N.v.t.																												
502	Voorbereiding	39 wkn	maa 13-5-19	vri 7-2-20	N.v.t.																												
503	Uitvoering	39 wkn	maa 10-2-20	vri 6-11-20	N.v.t.																												
504	7.2 Keerlus tram Beukendaal	110 wkn	maa 4-10-21	vri 10-11-23	zon 31-12-23																												

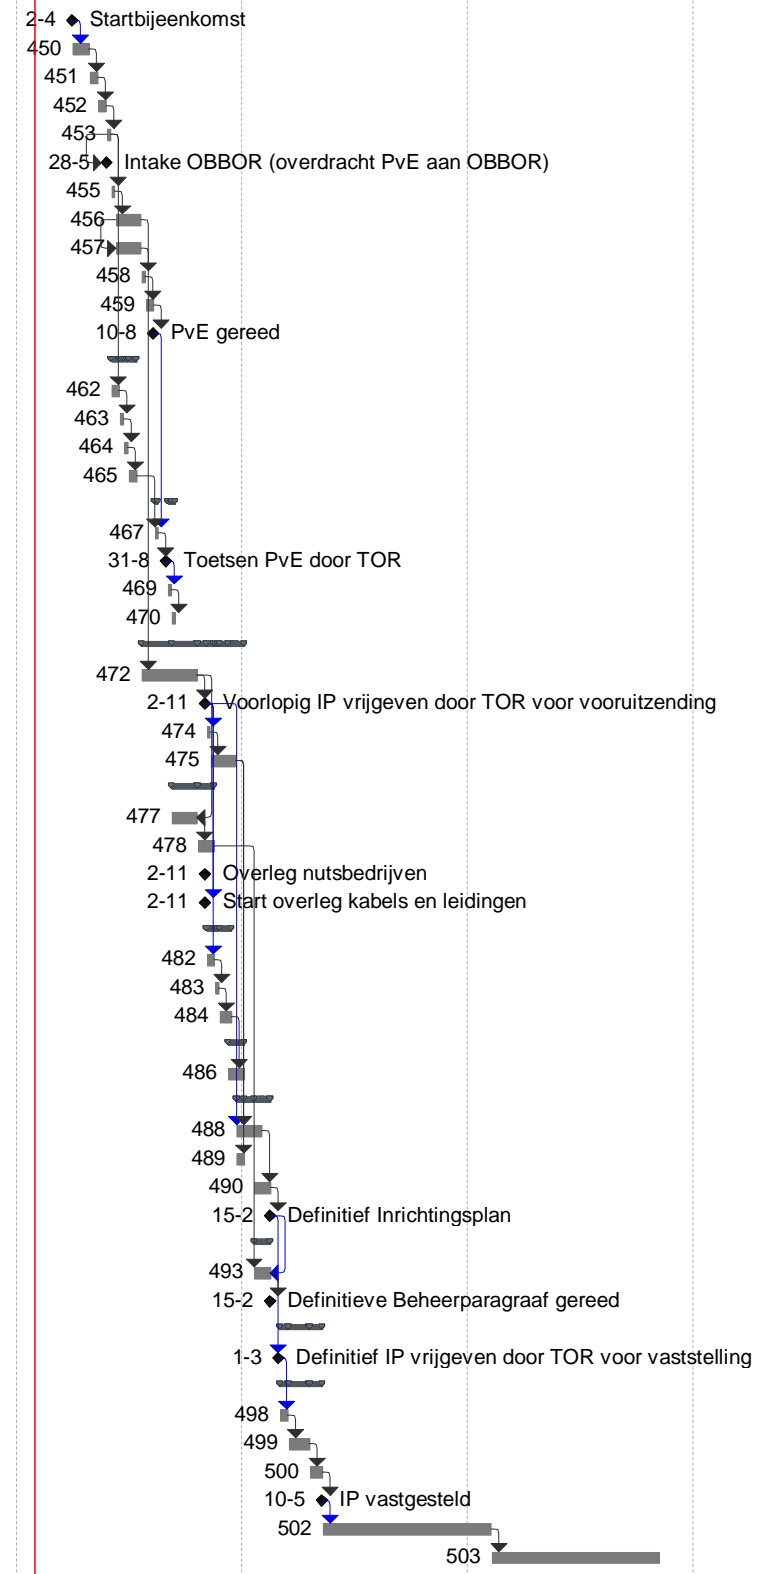

Planning Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Deadline	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023							
						k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1			
569	Startbijeenkomst	0 wkn	maa 5-3-18	maa 5-3-18	N.v.t.					5-3																											
570	Afstemming/vraag informatie uitzetten bij partners	4 wkn	maa 5-3-18	vri 30-3-18	N.v.t.					5-3																											
571	Afstemming geleverde informatie	2 wkn	maa 2-4-18	vri 13-4-18	N.v.t.					5-3																											
572	Opstellen concept PvE	2 wkn	maa 16-4-18	vri 27-4-18	N.v.t.					5-3																											
573	Concept PvE vaststellen en vrijgeven voor uitzending	1 wk	maa 30-4-18	vri 4-5-18	N.v.t.					5-3																											
574	Intake OBBOR (overdracht PvE aan OBBOR)	0 wkn	maa 30-4-18	maa 30-4-18	N.v.t.					5-3																											
575	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 7-5-18	vri 11-5-18	N.v.t.					5-3																											
576	Uitzending PvE	6 wkn	maa 14-5-18	vri 22-6-18	N.v.t.					5-3																											
577	Input gebiedsctie over inhoud en participatie	6 wkn	maa 14-5-18	vri 22-6-18	N.v.t.					5-3																											
578	Beoordeling informatie	1 wk	maa 25-6-18	vri 29-6-18	N.v.t.					5-3																											
579	Verwerken informatie in PvE	2 wkn	maa 2-7-18	vri 13-7-18	N.v.t.					5-3																											
580	PvE gereed	0 wkn	vri 13-7-18	vri 13-7-18	N.v.t.					5-3																											
581	Participatie (indien nodig)	6 wkn	maa 7-5-18	vri 15-6-18	N.v.t.					5-3																											
582	Voorbereiden participatie	2 wkn	maa 7-5-18	vri 18-5-18	N.v.t.					5-3																											
583	Participatie	1 wk	maa 21-5-18	vri 25-5-18	N.v.t.					5-3																											
584	Beoordeling informatie bewonersavond	1 wk	maa 28-5-18	vri 1-6-18	N.v.t.					5-3																											
585	Verslag participatie	2 wkn	maa 4-6-18	vri 15-6-18	N.v.t.					5-3																											
586	Toetsen en vaststellen PvE	5 wkn	maa 16-7-18	vri 17-8-18	N.v.t.					5-3																											
587	Toetsen gebiedsdirecteur of wensen gebiedscommissie gebouwen	1 wk	maa 16-7-18	vri 20-7-18	N.v.t.					5-3																											
588	Toetsen PvE door TOR	0 wkn	vri 3-8-18	vri 3-8-18	N.v.t.					5-3																											
589	Vaststellen PvE door gebiedsaccountmanager	1 wk	maa 6-8-18	vri 10-8-18	N.v.t.					5-3																											
590	Verzenden advies aan wethouder	1 wk	maa 13-8-18	vri 17-8-18	N.v.t.					5-3																											
591	Voorlopig IP	24 wkn	maa 25-6-18	vri 7-12-18	N.v.t.					5-3																											
592	Maken Voorlopig IP	13 wkn	maa 25-6-18	vri 21-9-18	N.v.t.					5-3																											
593	Voorlopig IP vrijgeven door TOR voor vooruitzending	0 wkn	vri 5-10-18	vri 5-10-18	N.v.t.					5-3																											
594	Administratieve voorbereiding uitzending	1 wk	maa 8-10-18	vri 12-10-18	N.v.t.					5-3																											
595	Vooruitzending	6 wkn	maa 15-10-18	vri 23-11-18	N.v.t.					5-3																											
596	Voorlopige beheerparagraaf	10 wkn	maa 13-8-18	vri 19-10-18	N.v.t.					5-3																											
597	Opstellen voorlopige beheerparagraaf	6 wkn	maa 13-8-18	vri 21-9-18	N.v.t.					5-3																											
598	Behandeling voorlopige beheerparagraaf	4 wkn	maa 24-9-18	vri 19-10-18	N.v.t.					5-3																											
599	Overleg nutsbedrijven	0 wkn	vri 5-10-18	vri 5-10-18	N.v.t.					5-3																											
600	Start overleg kabels en leidingen	0 wkn	vri 5-10-18	vri 5-10-18	N.v.t.					5-3																											
601	Participatie	6 wkn	maa 8-10-18	vri 16-11-18	N.v.t.					5-3																											
602	Voorbereiden participatie	2 wkn	maa 8-10-18	vri 19-10-18	N.v.t.					5-3																											
603	Participatie	1 wk	maa 22-10-18	vri 26-10-18	N.v.t.					5-3																											
604	Verslag participatie	3 wkn	maa 29-10-18	vri 16-11-18	N.v.t.					5-3																											
605	Advies gebiedscommissie	4 wkn	maa 12-11-18	vri 7-12-18	N.v.t.					5-3																											
606	Advies gebiedscommissie (kan periode eenmalig met 2 weken)	4 wkn	maa 12-11-18	vri 7-12-18	N.v.t.					5-3																											
607	Definitief IP	8 wkn	maa 26-11-18	vri 18-1-19	N.v.t.					5-3																											
608	Opstellen Definitief IP	6 wkn	maa 26-11-18	vri 4-1-19	N.v.t.					5-3																											
609	Opstellen reactiedocument	2 wkn	maa 26-11-18	vri 7-12-18	N.v.t.					5-3																											
610	Opstellen Ramingen	4 wkn	maa 24-12-18	vri 18-1-19	N.v.t.					5-3																											
611	Definitief Inrichtingsplan	0 wkn	vri 18-1-19	vri 18-1-19	N.v.t.					5-3																											
612	Definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 24-12-18	vri 18-1-19	N.v.t.					5-3																											
613	Opstellen definitieve beheerparagraaf	4 wkn	maa 24-12-18	vri 18-1-19	N.v.t.					5-3																											
614	Definitieve Beheerparagraaf gereed	0 wkn	vri 18-1-19	vri 18-1-19	N.v.t.					5-3																											
615	Procedure vaststellen IP	10 wkn	vri 1-2-19	vri 12-4-19	N.v.t.					5-3																											
616	Definitief IP vrijgeven door TOR voor vaststelling	0 wkn	vri 1-2-19	vri 1-2-19	N.v.t.					5-3																											
617	Vaststellen IP door B&W	10 wkn	maa 4-2-19	vri 12-4-19	N.v.t.					5-3																											
618	Opstellen agendapost	2 wkn	maa 4-2-19	vri 15-2-19	N.v.t.					5-3																											
619	Interne parafering	5 wkn	maa 18-2-19	vri 22-3-19	N.v.t.					5-3																											
620	Vaststellen agendapost door B&W	3 wkn	maa 25-3-19	vri 12-4-19	N.v.t.					5-3																											
621	IP vastgesteld	0 wkn	vri 12-4-19	vri 12-4-19	N.v.t.					5-3																											
622	Voorbereiding	182 wkn	maa 15-4-19	vri 7-10-22	N.v.t.					5-3																											
